

Формирование команды проекта

Выполнили:

Борисевич А.В.

Стафеев И.А.

Ходакова М.А.

УП1.1

О чем проект

Мобильная игровая экосистема, которая превращает посещение музея в интерактивный образовательный опыт для детей 6–12 лет.

Сегодня музейный формат **не адаптирован под восприятие ребенка**. Дети не понимают, на что обращать внимание, быстро теряют интерес и начинают скучать. Родители вынуждены удерживать внимание ребенка самостоятельно. Это снижает качество совместного досуга.

Мы предлагаем ребенку **понятный игровой сценарий посещения**: квесты по экспозициям, интерактивные задания и систему прогресса с наградами. Виртуальный персонаж адаптирует задания под детскую аудиторию и поддерживает вовлеченность, а родитель спокоен за ребенка.

Платформа позволяет **быстро подключать новые музеи** и экспозиции без доработки приложения.


В результате мы превращаем музей из пассивного пространства в **управляемый, увлекательный опыт**, повышая **вовлеченность детей**, образовательную ценность посещений.



Определение ролей

Участник	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Итоговая роль
Анна	Только она сочетает сильную ориентацию и на результат, и на командную работу.	Единственная, кто одновременно нацелен на успех и способен анализировать ситуацию широко , а не в одиночку.	Анна выполняет ключевую роль лидера, направляющего команду к общей цели.	Руководитель проекта (Ведущий и Оформитель)
Иван	Хорошо решает задачи. Может спорить и не соглашаться , но так он ищет лучшие решения	Нацелен на успех , но больше ценит работу в малых группах или индивидуально , ему ближе лидерство через идеи.	Придумывает новые решения и эффективно выполняет работу. Его вклад в проект - идеи и реализация задач.	Генератор идей и Рабочая пчелка
Мария	Хорошо поддерживает команду и решает задачи , но по части задач уступает Анне.	Предпочитает поддерживать коллег и вдумчиво разбираться в задачах , а не брать на себя публичное управление.	Анализирует слабые места , помогает улаживать разногласия и поддерживает общий настрой.	Критик и Опора команды


Иерархическая структура проекта 1/4

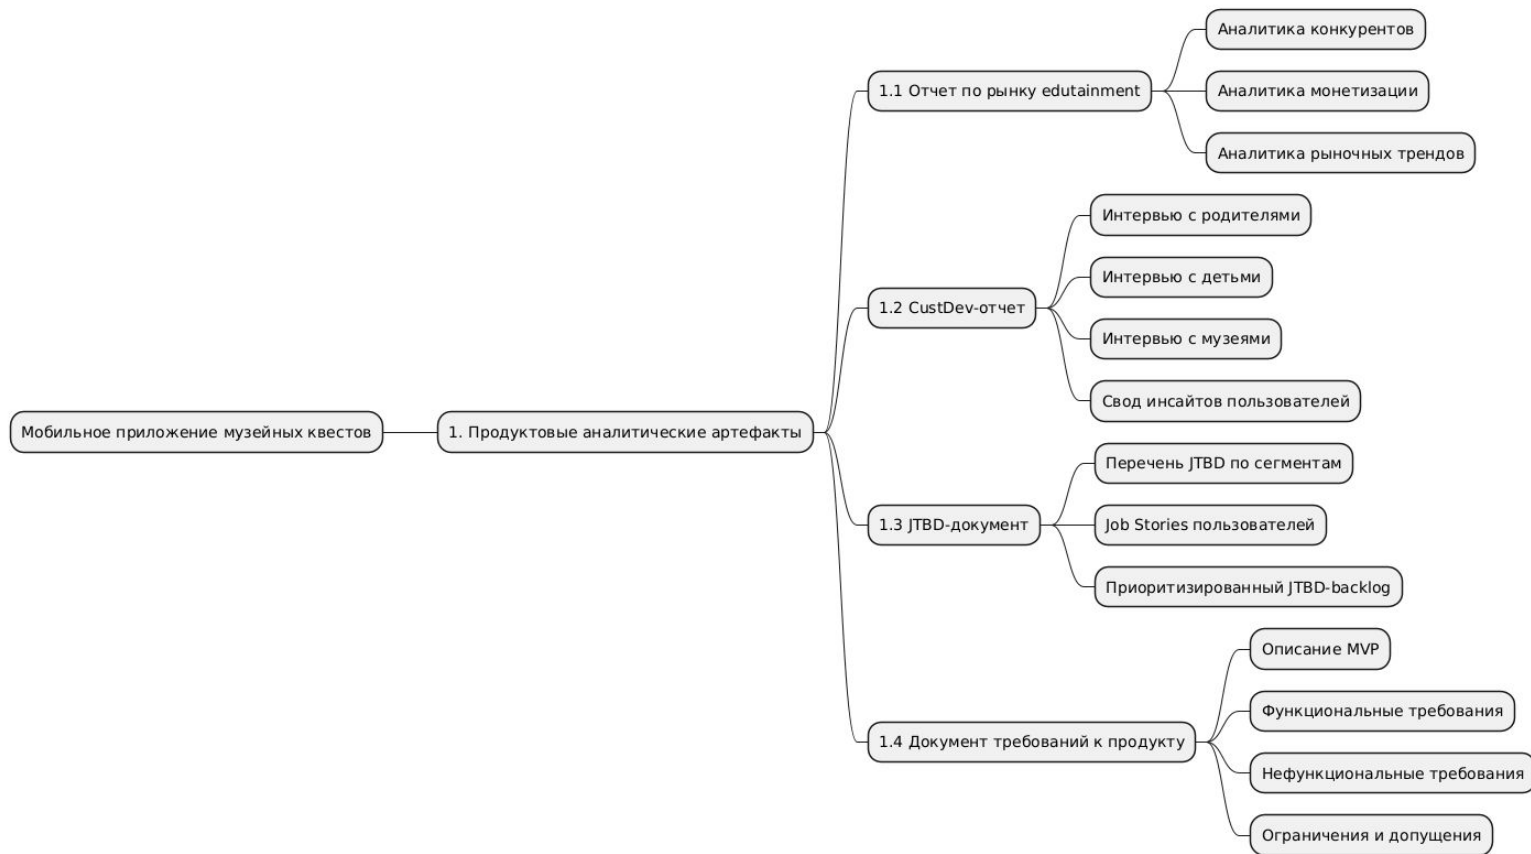


Иерархическая структура проекта 2/4



Иерархическая структура проекта 3/4

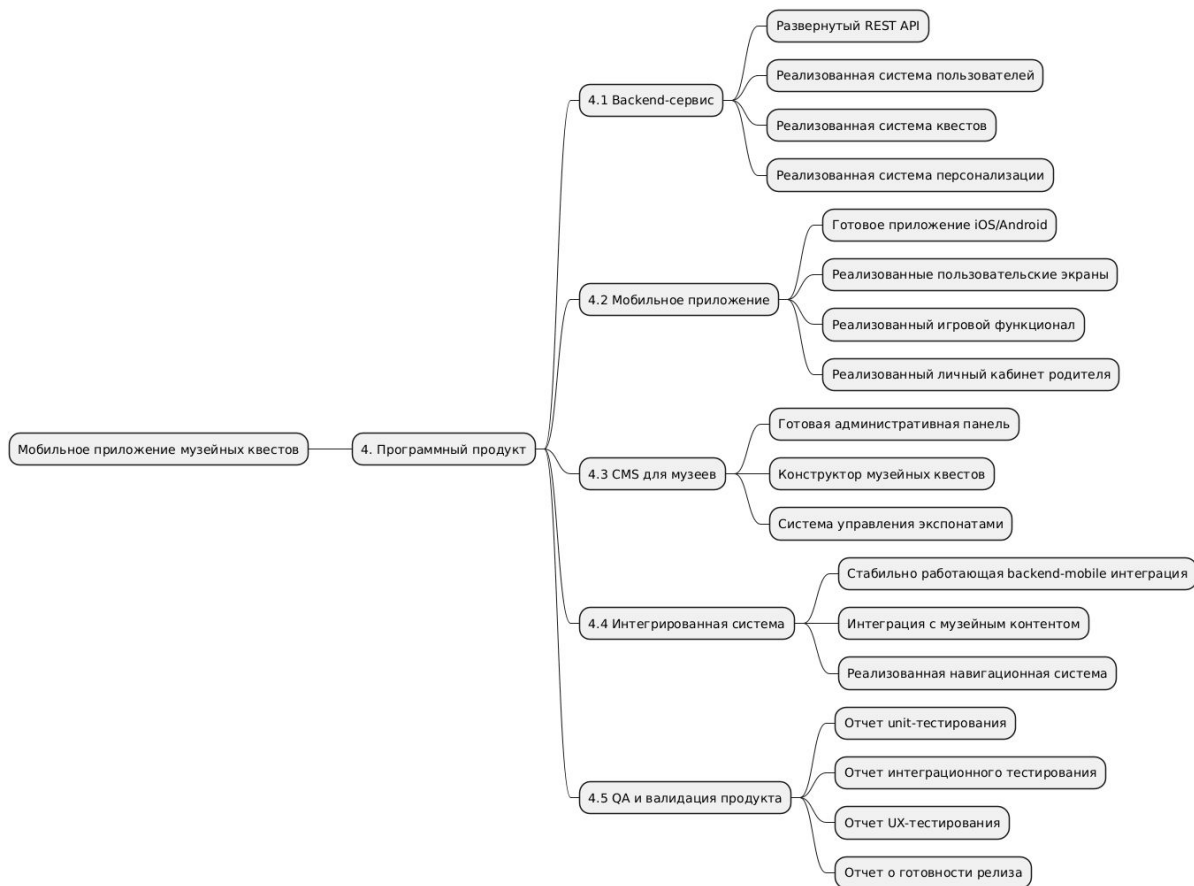

Иерархическая структура проекта 4/4

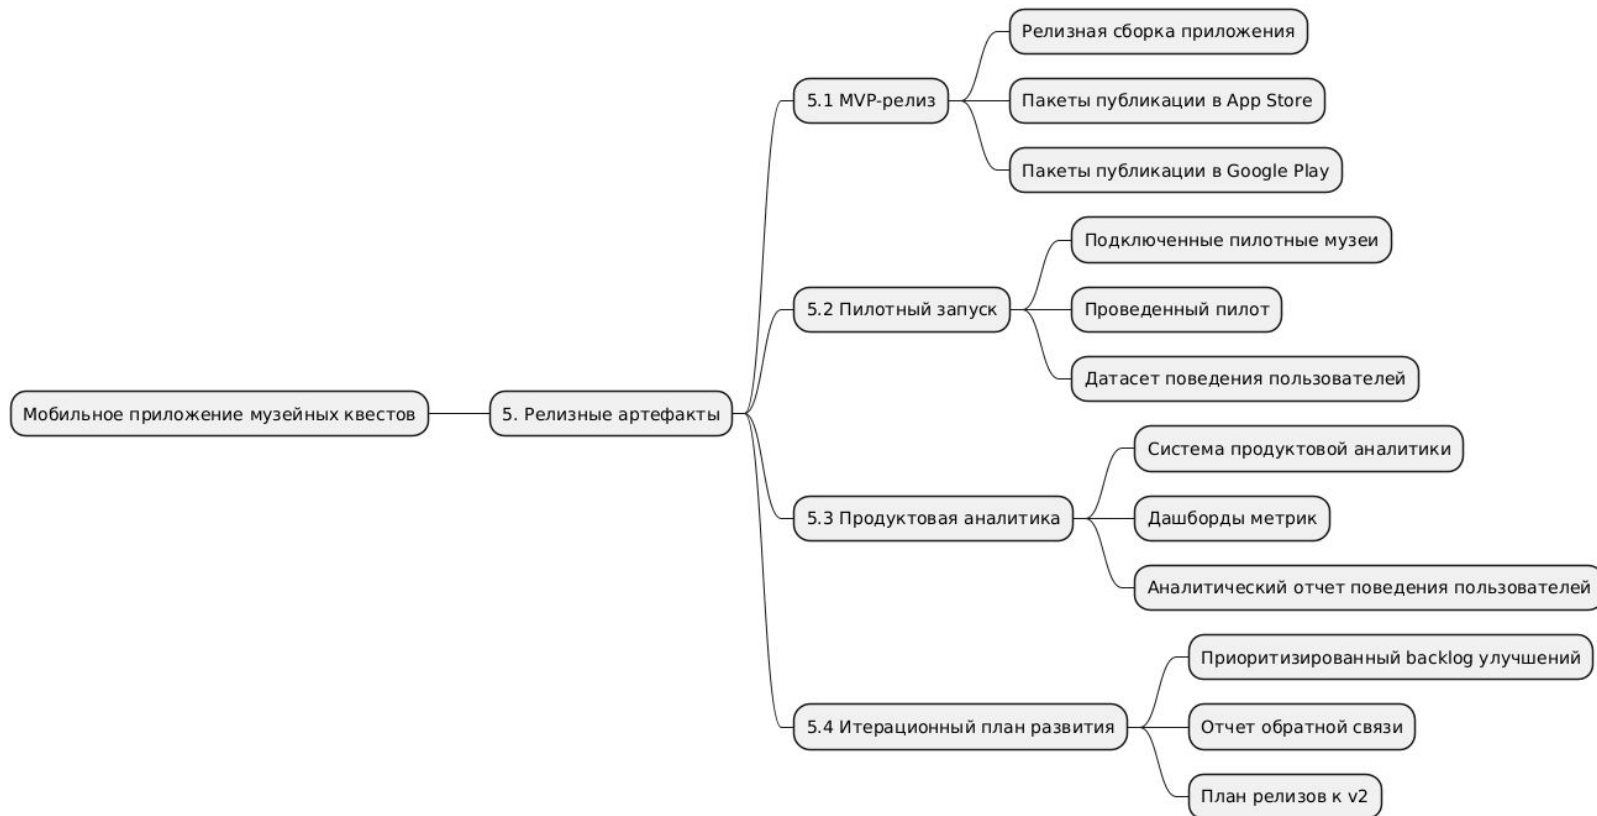

Матрица ответственностей RACI

Фаза / Задача	Анна Руководитель/ Оформитель	Иван Генератор/Рабочая пчелка	Мария Критик/Опора
ФАЗА 1 - АНАЛИТИКА			
1.1 Анализ рынка и конкурентов	A	I	R
1.2 CustDev-интервью (родители, дети, музеи)	A R	C	R
1.3 Формирование JTBD и Job Stories	A R	C	C
1.4 Определение требований	A R	C	C
ФАЗА 2 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ			
2.1 Архитектура системы (backend, БД)	A	R	C
2.2 User Flow (ребёнок, родитель, музей)	A R	C	I
2.3 Игровые механики, логика квестов	A C	R	C
2.4 Проектирование интеграций (QR / маяки)	A	R	I

R - исполнитель, A - ответственный, C - консультант, I - информируется

Матрица ответственностей RACI

Фаза / Задача	Анна Руководитель/ Оформитель	Иван Генератор/Рабочая пчелка	Мария Критик/Опора
ФАЗА 3 - ДИЗАЙН			
3.1 UX-дизайн (wireframes, прототипы)	A R	I	C
3.2 UI-дизайн, игровые элементы, питомец	A R	C	C
3.3 Сценарии квестов и контент заданий	C	A R	C
ФАЗА 4 - РАЗРАБОТКА			
4.1 Backend: API, логика квестов, персонализация	A	R	I
4.2 Мобильное приложение (iOS / Android)	A	R	I
4.3 CMS для музеев (инструменты квестов)	C	A R	I
4.4 Функциональное тестирование + исправление	I	C	A R
4.5 UX-тестирование с фокус-группой	C	I	A R
ФАЗА 5 - ЗАПУСК MVP			
5.1 Регистрация ООО, оформление документов	A R	I	I
5.2 Подготовка контента для пилотных музеев	A	R	C
5.3 Аналитика, метрики, обратная связь	A R	C	R
5.4 Бизнес-план и сайт проекта (ФСИ)	A R	C	C

Диаграмма Ганта

ДИАГРАММА ГАНТА · Мобильное приложение с музейными квестами для детей

[illegible]

Календарный план

№	Наименование работы	Срок	Ответственный	Форма отчётности
ЭТАП 1 · АНАЛИТИКА				
1.1	Анализ рынка, конкурентов и трендов	01.06 – 30.06.2026	Мария (R), Анна (A)	Аналитический отчёт
1.2	CustDev-интервью: родители, дети, музеи	01.06 – 31.07.2026	Анна + Мария (R), Иван (C)	Транскрипты, инсайты
1.3	Формирование JTBD и Job Stories	15.07 – 31.07.2026	Анна (A,R)	JTBD-документ
1.4	Определение MVP, функц. и нефункц. требования	15.07 – 31.08.2026	Анна (A,R)	Требования к MVP (SRS)
ЭТАП 2 · ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
2.1	Архитектура backend, БД экспонатов	01.08 – 30.09.2026	Иван (R), Анна (A)	Техническое задание
2.2	User Flow ребёнка, родителя, музея	01.08 – 30.09.2026	Анна (A,R)	User Flow схемы
2.3	Игровые механики, логика квестов, ачивки	01.09 – 31.10.2026	Иван (R), Анна (A)	Спецификация механик
2.4	Проектирование навигации (QR / маяки)	01.09 – 31.10.2026	Иван (R)	Схема интеграций
ЭТАП 3 · ДИЗАЙН				
3.1	UX-дизайн: wireframes и прототипы экранов	01.10 – 31.10.2026	Анна (A,R), Мария (C)	Figma-прототип
3.2	UI-дизайн интерфейса, игровых элементов, питомца	01.10 – 30.11.2026	Анна (A,R)	Дизайн-система, макеты
3.3	Разработка сценариев квестов и заданий	01.10 – 30.11.2026	Иван (A,R)	Контент-библиотека

Календарный план

№	Наименование работы	Срок	Ответственный	Форма отчётности
ЭТАП 4 · РАЗРАБОТКА				
4.1	Backend: API, логика квестов, персонализация	01.10.2026 – 28.02.2027	Иван (R), Анна (A)	Рабочий backend, API-документация
4.2	Мобильное приложение (iOS + Android)	01.11.2026 – 28.02.2027	Иван (R), Анна (A)	Сборки приложения
4.3	CMS для музеев, инструменты создания квестов	01.12.2026 – 28.02.2027	Иван (A,R)	Работающая CMS
4.4	Функциональное тестирование + исправление багов	01.02 – 31.03.2027	Мария (A,R)	Отчёт о тестировании
4.5	UX-тестирование с фокус-группой (30–50 семей)	01.03 – 30.04.2027	Мария (A,R), Анна (C)	UX-отчёт, видеозаписи
ЭТАП 5 · ЗАПУСК MVP				
	Регистрация ООО (доля победителя ≥51%, гендиректор)	до 31.03.2027	Анна (A,R)	Выписка ЕГРЮЛ, устав
5.1	Подготовка контента для пилотного запуска	01.02 – 30.04.2027	Иван (R), Мария (C)	Контент в базе
5.2	Бизнес-план проекта (требование ФСИ)	01.04 – 15.05.2027	Анна (A,R)	Бизнес-план
5.3	Сайт проекта с логотипами ФСИ	01.04 – 15.05.2027	Анна (A,R)	Опубликованный сайт
5.4	Сбор метрик и обратной связи пилотного запуска	01.04 – 31.05.2027	Мария (R), Анна (A)	Аналитический дашборд
	Запуск MVP	до 31.05.2027	Анна (A)	MVP

Спасибо за внимание!

Выполнили:

Борисевич А.В.

Стафеев И.А.

Ходакова М.А.

УП1.1
